


LAVORI ULTIMATI
NEL CORSO DEL
2007

Nel corso dell'anno 2007 Anas ha ultimato n. 197 lavori per complessivi 1.597,93 €/Milioni, di cui :

- Manutenzione Straordinaria n. 152 lavori per un importo complessivo di 271,69 €/Milioni;
- Nuove Opere n. 45 per un importo complessivo di 1.326 €/Milioni, così distribuiti sul territorio:

Il grafico seguente sintetizza la distribuzione per aree geografiche dei lavori ultimati nel corso del 2007. L'indicatore usato è l'importo complessivo dell'intervento.

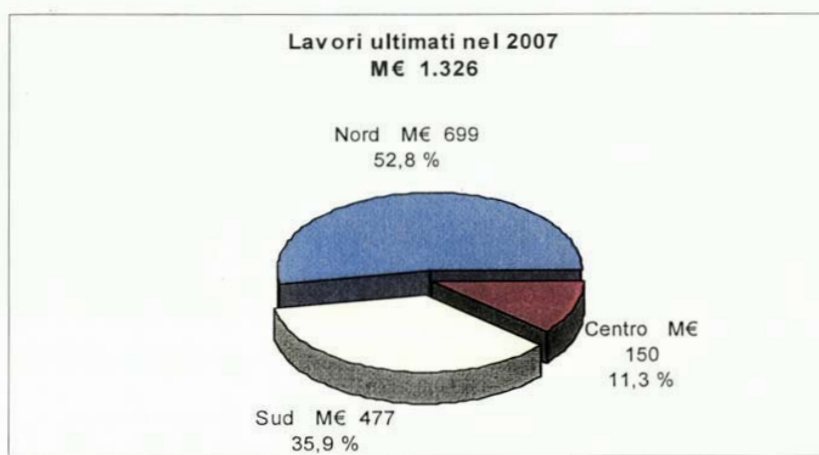

Un maggior dettaglio relativo agli interventi ultimati, selezionati fra quelli più significativi di ciascun compartimento, è riportato nella **tabella 3** nella quale non vengono compresi interventi sulle grandi infrastrutture per le quali vengono dati specifici dettagli nel seguito.

Tabella 3

C.to	Intervento	Importo €/Milioni
TO	Collegamento Asti-Cuneo – Tronco 2, Lotto 3 A (Motta – Govone)	71,990
TO	Collegamento Asti-Cuneo – Tronco 2, Lotto 8 – Cherasco – A6	109,290
TO	SS 33 "Del Sempione" – Tronco: Gravellona-Toce-Iselle. Lavori di ammodernamento del tratto compreso tra il Km 131+750 ed il Confine di Stato. Lotto 1 – Stralcio 2	85,840
MI	SS 671 "Della Val Seriana" – Lavori di costruzione Raccordo Seriate Nembro-Albino-Gazzaniga. Lotto Unico	75,420
MI	SS 42 "Del Tonale e della Mendola" – Raccordo Seriate(SS 42)-Nembro Albino-Gazzaniga. Lotto 1 dallo svincolo di Cassinone di Seriate(SS 498)-Tang.sud di Bergamo alla SP 65	79,800
VE	SS 10 "Padana Inferiore" – Variante agli abitati di Monselice ed Este	40,480
VE	SS 246 "Di Recoaro" – Variante di Montecchio Maggiore	37,050

BO	SS 9 "Via Emilia" – Lavori di realizzazione Lotto 2 della Secante di Cesena – Variante alla SS 9 dal Km 2+282 al Km 5+256,52	81,780
BO	Tangenziale di Forlì. Sistema tangenziale Est 1 Lotto	30,970
FI	SGC "Grosseto-Fano" – Tratto Arezzo-Monterchi. Lavori di costruzione del tratto compreso tra le località "Palazzo del Pero" e "Le Villi di Monterchi"–5 Lotto	15,050
AN	SS 78 "Picena" – Tronco Ascoli Piceno – Comunanza Lotto 2: Ponte Starese Carbonaia – Prolungamento Funzionale del 2 stralcio con l'innesto della SS 78	15,610
CB	SS 653 "Della Valle del Sinni" – Lavori straordinari per interventi di riqualificazione della strada SS 653 Sinnica dal Km 11+000 al Km 18+000 e dal Km 43+000 al 61+000, per un importo pari ad €/Milioni	7,470
CB	SS 407 "Basentana" – Progetto esecutivo per la costruzione dello svincolo a piani sfalsati per l'abitato di Bernalda tarle Km 91+200 e 92+500	6,400
RM	G.R.A. – Lavori di adeguamento a tra corsie per ogni senso di marcia – Quadrante Nord-Ovest dal Km 12+650 al Km 13+900 – lotto 4	34,880
CA	SS 131 "Carlo Felice" – Lavori di ammodernamento e adeguamento del Tronco Compreso tra il Km 69+500 e il 146+800. Lotto 3 – 1 stralcio dal Km 88+357 al Km 93+400	25,960
CA	SS 125 "Orientale Sarda" – Lavori di Costruzione della Nuova SS 125 tra S. Priamo e Tertenia Lotto 2 Stralcio 2	25,960
CA	SS 131 "Carlo Felice" – Lavori per l'adeguamento e l'ammodernamento della SS 131. Eliminazione delle intersezioni a raso in corrispondenza dell'abitato di Sanluri	34,420
NA	SS 517 "Bussentina" – Lavori di completamento della variante alle SS.SS. 18 e 517 dal Km 19+300 della SS 517 allo svincolo di Buonabitacolo escluso	7,510
SA-RC	Lavori di ammodernamento ed adeguamento tipo 1/b Norme CNR/80 – Tronco 1- Tratto 1- Lotto 2 – dal Km 8+000 al Km 13+000 – Carreggiata Sud	55,920
AQ	SS 80 "del Gran Sasso D'Italia" – lavori di costruzione della variante alla statale fra Teramo e Giulianova – Lotto 3 – tratto Villa Zaccheo – Mosciano Stazione	53,660
CZ	SS 182 "delle Serre Calabre" – Tronco 5 – Lotto 2 – Progetto esecutivo dallo Svincolo di Chiaravalle Argusto alla S.P. per Argusto, per un importo di €/Milioni.	19,860
PA	SS 115 – Interventi di messa in sicurezza degli impalcati dei viadotti Carboi, S.Vincenzo I e II tra i Km 99+370 e 101+380,	14,180

L'AUTOSTRADA A3
SALERNO —
REGGIO CALABRIA

Le grandi infrastrutture



Lo stato del progetto generale d'ammodernamento dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria è rappresentato visivamente nella cartina stradale riportata.

Il progetto è attualmente suddiviso in 57 interventi dei quali 11 Macrolotti e 46 Lotti, inclusi 4 lotti per la realizzazione di altrettanti svincoli, non previsti nell'originario piano per l'adeguamento, e introdotti in accoglimento delle richieste ricevute da Regioni ed Enti Locali.

Al 31 dicembre del 2007, 25 interventi risultano ultimati consentendo l'apertura al traffico di 166,5 km di autostrada rimodernata.

I restanti 32 interventi, alla stessa data, si trovano nelle varie fasi che vanno dalla progettazione alla esecuzione dei lavori secondo i dettagli seguenti:

INTERVENTI	N.	KM.
ULTIMATI E APERTI AL TRAFFICO	25	166,50
APPALTATI, IN AVVIO E CON LAVORI IN CORSO	12	133,50
OGGETTO DI RESCISSIONE E IN FASE DI NUOVO APPALTO	1	11,00
PROCEDURE DI APPALTO IN CORSO	9	68,00
PROGETTAZIONE IN CORSO	10	64,00
TOTALE	57	443,00

Attualmente i lavori ultimati, in corso e in appalto sull'Autostrada riguardano circa 379 Km della stessa, pari a circa l' 86 % dell'intero tracciato (443 km).

Gli stanziamenti ad oggi resi disponibili ammontano a 6.019 €/Milioni che unitamente a quanto previsto dalla Finanziaria 2007, che ha trasferito all'ANAS le risorse ex Fondo Centrale di Garanzia, consentono di finanziare gli interventi in esecuzione, appaltati, in fase di contrattualizzazione, contrattualizzati e non cantierati e quelli già in fase di gara d'appalto.

I progetti già approvati per un importo totale di 1.626 €/Milioni sono finanziati con l'utilizzo di residui ancora disponibili sui finanziamenti assentiti (6.019 €/Milioni) e con l'utilizzo di quanto stanziato nella Finanziaria 2007 per l'adeguamento dell'autostrada (ex Fondo di Garanzia).

Per la realizzazione delle tratte ancora in progettazione, per un'estesa di circa 64 Km, dovranno essere resi disponibili circa 2.122 €/Milioni.

Nelle tabelle che seguono si forniscono i dettagli degli interventi in corso alla data del 31/12/2007 suddivisi per le diverse fasi di avanzamento.

A3 SA - RC LAVORI IN CORSO AL 31/12/2007				
	Tronco	Lavori di ammodernamento ed adeguamento alle Norme CNR/80 dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria. Progressive Lotto	Impresa	Importo netto progetto (€/Milioni)
1	1°	dal Km.3+000 al Km 8+000 (Fratte - San Mango)	S.A.F.A.B. - A. & I. DELLA MORTE	112,60
2	Svincolo di San Mango	dal Km.4+500 al Km 5+500 (Svincolo San Mango)	FONTANA COSTRUZIONI S.p.A.	10,47
3	1°	dal Km.29+400 al Km 30+000 (Svincolo di Eboli)	I.CO.GI.	11,02
4	1°	dal Km.47+800 al Km 53+800 (Svincolo Contursi - Svincolo Sicignano)	PIZZAROTTI & C.	238,00
5	1° MACROLOTTO	dal Km.53+800 al Km 82+330 (Svincolo Sicignano - Svincolo Atena Lucana)	C.M.C.	597,04
6	2° MACROLOTTO	dal Km.108+000 al Km 139+000 (Viadotto Calore - Svincolo Lauria Nord)	CONSORZIO SIS	1.038,98
7	2°	dal Km.222+000 al Km 225+800 (Svincolo di Spezzano - Svincolo di Tarsia)	CARENA - IRCES 95	150,12
8	4B° MACROLOTTO	dal Km.286+000 al Km 304+200 (Svincolo di Altilia-Grimaldi - Nuovo Svincolo di Falema)	PIZZAROTTI & C.	447,80
(*)	3°	dal Km.320+400 al Km 331+400 (Svincolo Lamezia Terme - Torrente Randace)	CONSORZIO APPALTATORI RIUNITI	46,53
9	3°	dal Km.359+400 al Km 369+800 (Svincolo di Serre - Svincolo di Mileto)	SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA	118,90
10	3°	dal Km.369+800 al Km 378+500 (Svincolo di Mileto - Località Candidoni)	SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA	57,47
11	5° MACROLOTTO	dal Km.393+500 al Km 423+300 (Svincolo di Gioia Tauro - Svincolo di Scilla)	IMPREGILO - CONDOTTE	1.065,19
12	6° MACROLOTTO	dal Km.423+300 al Km 442+920 (Svincolo di Scilla - Reggio Calabria)	IMPREGILO - CONDOTTE	634,23

(*) Contratto rescisso per il quale sono state avviate le procedure di nuovo appalto.

SA - RC: GARE IN CORSO AL 31/12/2007				
	Tronco	Lavori di ammodernamento ed adeguamento alle Norme CNR/80 dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria. Progressive Lotto	Importo progetto (€/Milioni)	di cui lavori
1	1°	dal Km.12+800 al Km 14+544 (Svincolo Pontecagnano)	16,43	12,03
2	Svincolo di Pagliarone	Km.17+750 (Località Pagliarone)	4,45	2,42
3	1°	dal Km.22+400 al Km 23+000 (Località Battipaglia)	39,04	28,23
4	1°	dal Km.88+657 al Km 103+840 (Sala Consilina - Buonabitacolo)	49,41	37,36
5	3° MACROLOTTO (parte 1^)	dal Km.139+000 al Km 148+000 (Svincolo Lauria Nord - Laino Borgo)	532,75	384,86
6	3° MACROLOTTO (parte 2^)	dal Km.153+400 al Km 173+900 (Svincolo di Laino Borgo - Svincolo di Campotenese)	654,37	491,19
7	3° MACROLOTTO (parte 3^)	dal Km.173+900 al Km 185+000 (Svincolo di Campotenese - Svincolo Morano Castrovillari)	287,04	213,19
8	2°	dal Km.206+500 al Km 213+500 (Svincolo di Firmo - Svincolo di Altomonte)	31,70	23,36
9	3°	dal Km.353+000 al Km 355+800 (Località La Motta)	34,80	25,97

SA-RC LOTTI IN PROGETTAZIONE AL 31/12/2007				
NR	Tronco	Lavori di ammodernamento ed adeguamento alle Norme CNR/80 dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria. Progressive Lotto	Importo progetto	di cui per lavori
1	Svincolo di Eboli (nuovo)	Km.31+600	15,8	9,6
2	Svincolo di Sala Consilina (nuovo)	Km.95+244 (Località Sala Consiliana)	15,51	10,0
3	Svincolo di Padula (nuovo)	Km.103+207 (Località Padula)	18,85	12,35
4	2°	dal Km.148+000 al Km 153+400 (Galleria Fossino - Svincolo di Laino Borgo)	80,9	61,5
5	3° MACROLOTTO (parte 4^)	dal Km.185+000 al Km 206+500 (Svincolo Morano Castrovillari - Svincolo Firmo)	427,04	333,51
6	4° MACROLOTTO (parte 1)	dal Km.259+700 al Km 270+700 (Svincolo di Cosenza -)	432,3	337,93
7	4° MACROLOTTO (parte 2)	dal Km.270+700 al Km 286+000 (Svincolo Altilla -)	647,9	506,9
8	3°	dal Km.337+800 al Km 348+600 (Svincolo di Pizzo Calabro - Svincolo di Sant'Onofrio)	451,8	338,26
9	Svincolo di Laureana di Borrello (nuovo)	al km 380+000 (Località Laureana di Borrello)	17,78	11,87
10	3°	al km 383+000 (svincolo di Rosarno)	15,12	12,09

STRADA STATALE
106 "JONICA"

La Statale "Ionica" ha un'estensione complessiva, da Taranto a Reggio Calabria, di circa 491 chilometri di cui circa 39 chilometri nella Regione Puglia, circa 37 chilometri nella Regione Basilicata e circa 415 chilometri nella Regione Calabria.

L'Anas ha già eseguito l'ampliamento a quattro corsie, con spartitraffico centrale (Tipo III CNR), per tutto il tratto ricadente nella Regione Puglia (Km. 39). Nella Regione Basilicata è già stato eseguito l'adeguamento a quattro corsie (Tipo III CNR) per 14 chilometri, è in corso l'adeguamento per circa altri 20 chilometri, e nello scorso mese di agosto è stato approvato dal CIPE il progetto preliminare della Variante di Nova Siri.

Nella Regione Calabria l'ANAS ha realizzato l'adeguamento a quattro corsie (Tipo III CNR) per circa 12 chilometri, al confine con la Regione Basilicata, mentre è in corso l'adeguamento in corrispondenza degli abitati di Rocella Ionica.

Per la restante parte della SS 106 "Ionica", ricadente nel territorio della regione Calabria, è previsto l'adeguamento con sezione del tipo B delle norme di cui al D.M. 5.11.2001.

La nuova "Ionica" sarà completamente integrata con l'Autostrada Salerno - Reggio Calabria mediante la realizzazione delle trasversali di collegamento, delle quali la cosiddetta trasversale "delle Serre" in corso di esecuzione.

Gli interventi previsti, per la realizzazione della "nuova Ionica" fuori sede nella regione Calabria, sono articolati in 12 Megalotti di cui 2 in esecuzione e 10 da appaltare con affidamento a Contraente Generale, e da 2 lotti da appaltare con il sistema dell'appalto integrato per un investimento totale stimato di circa **15 €/Miliardi**.

Nel seguito si riportano gli elenchi dei lotti ultimati nel corso del 2007 e di quelli tuttora in fase di esecuzione con l'avanzamento progressivo registrato al 31/12/2007

SS 106 JONICA : LAVORI ULTIMATI AL 31/12/2007				
Intervento	L.zza km	Regione Provincia	Importo Progetto (€/Miloni)	SAL %
Variante esterna a Roccella 2° lotto	4,61	CALABRIA R.Calabria	11,7	100,00%

SS 106 JONICA : LAVORI IN CORSO AL 31/12/2007					
	Intervento	L.zza km	Regione Provincia	Importo Progetto (€/Miloni)	SAL %
1	4° MACROLOTTO LOTTO 8°	12	BASILICATA Potenza	70,66	70,00%
2	4° MACROLOTTO LOTTO 9°	8	BASILICATA Potenza	72,69	60,00%
3	MEGALOTTO 1 S.Illario-Gioiosa dal Km 90+000 al km 107+000	17	CALABRIA Reggio Calabria	450,00	0,00%
4	MEGALOTTO 2 Squillace - Simeri dal km 178+350 al Km 197+500	23	CALABRIA Catanzaro	652,36	7,00%
5 (*)	PALIZZI LOTTO 2°	5	CALABRIA Reggio Calabria	134,00	20,00%
6	VARIANTE ALL'ABITATO DI MARINA DI GIOIOSA JONICA dal Km 107+000 al km 110+550	4	CALABRIA Reggio Calabria	131,00	30,00%
7 (**)	Variante tra i km 403+227 e 405+950 Impianti	2,7	CALABRIA Cosenza	11,83	0,00%
8 (**)	Variante tra i km 405+950 e 406+600 (Montegiordano)	0,7	CALABRIA Cosenza	4,769	0,00%

(*) Lavori sospesi per ordine della magistratura

(**) Lavori in fase di aggiudicazione definitiva e contrattualizzazione

L'AUTOSTRADA DEL
GRANDE
RACCORDO
ANULARE DI ROMA

L'intervento riguarda il tratto del Grande Raccordo Anulare compreso tra lo svincolo con la S.S. n. 1 "Aurelia" e lo svincolo con la S.S. n. 3 "Flaminia" presso la loc. Castel Giubileo e consentirà di portare a completamento l'adeguamento a tre corsie per ogni senso di marcia di tutto il Grande Raccordo Anulare di Roma.

L'estensione dell'intervento è di oltre 18,5 Km e comporta un impegno finanziario di circa 613 €/Milioni.

Le opere citate sono state realizzate in gran parte in variante di tracciato rispetto all'esistente con modifiche altimetriche rilevanti per la quasi totalità del tracciato e con la costruzione di numerose nuove gallerie artificiali e naturali nonché viadotti.

Nel corso del 2007 sono stati aperti al traffico i seguenti lotti:

- Lotto 3° - 2° Stralcio dal Km 9+900 al Km 11+250 per un importo di 71,62 €/Milioni.
- Lotto 6° dal Km 17+400 al Km 18+800: per un importo di 89,15 €/Milioni.
- Lotto 4° dal Km 12+650 al Km 13+900: per un importo di 32,53 €/Milioni.

In definitiva risultano già aperte al traffico la quasi totalità delle opere previste all'interno dell'intervento di ammodernamento a tre corsie dal km 0+450 al km 18+800 ad eccezione del tratto di circa 1.000 m in corrispondenza della Via Cassia.

Su tale tratto è in corso di ultimazione lo scavo della galleria, la cui esecuzione permetterà entro la Primavera 2008 il totale completamento dell'ammodernamento a tre corsie dell'intero quadrante Nord Ovest in carreggiata esterna.

La Galleria Cassia in carreggiata interna è stata stralciata dai lavori in corso a seguito di una perizia di variante tecnica approvata nel mese di Giugno 2007 ed è oggetto di un progetto di completamento che è stato pubblicato nel mese di Dicembre 2007. In considerazione dei tempi tecnici necessari all'espletamento delle procedure di aggiudicazione, e dell'esecuzione dei lavori, si può ipotizzare un'ultimazione integrale dell'intero lotto per la Primavera 2009.

LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
GLI INTERVENTI DI
SOMMA URGENZA

L'anno 2007 è stato caratterizzato dalla ripresa della attività programmatica e realizzativa dell'ANAS, culminata con la definizione del nuovo Contratto di programma 2007/2011, il cui piano di appaltabilità 2007 è stato approvato dai Ministeri Vigilanti con D.I.M. 3191 del 21/11/2007, successivamente registrato dalla Corte dei Conti in data 17.12.2007.

In questo anno sono stati attivati per l'appalto oltre 200 interventi codificati come manutenzione straordinaria (pavimentazioni, barriere, sicurezza stradale, ecc.) per un ammontare complessivo lordo a base di appalto di circa 234 €/Milioni.

Sono invece giunti a conclusione n° 137 interventi, già avviati negli anni precedenti per un ammontare netto finale per lavori di circa 156 €/Milioni.
