

Misure ambientali connesse con la realizzazione del "Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC-ZPS IT 3250003 e IT 3250023; dei SIC IT 3250030 e IT 3250031 e della ZPS IT 3250046 – quadro aggiornato"

Attività finanziate:

Attività ultimate nel 2011

1. OP/444 Bocca di Malamocco: misure di riqualificazione 1^a fase
2. C.1.10 Valutazione degli habitat ricostruiti nell'ambito degli interventi di recupero morfologico

Attività in corso nel 2011

1. C.1.7 Creazione aree a molluschicoltura
2. C.1.9 Riqualificazione degli habitat del litorale veneziano
3. OP/496 Trapianto fanerogame
4. OP/380 Gestione del vivaio piante alofile nell'Isola dei Laghi
5. OP/510 Riqualificazione del bacino di Lusenzo - 1° stralcio dragaggio
6. OP/498 Messa in sicurezza rive casone Valle Millecampi
7. OP/501-1 e 501-2 Valorizzazione ambientale dei fondali di valle Millecampi e Monitoraggio
8. OP/483 Gestione vivaio piante alofile nell'isola dei Laghi anni 2009-2011
9. OP/499 Creazione zone di tutela biologica e marine (tegnue)
10. OP/506-1 Ripristino morfologico e ambientale del canale Bastia - 1° stralcio

Attività avviate nel 2011

1. OP/519 Canale Passaora, area lagunare circostante l'isola del Lazzaretto Nuovo - interventi di protezione, di riqualificazione di strutture morfologiche - 1° stralcio
2. OP/525 e 525-bis Ripristino morfologico ed ambientale dell'area del canale Bastia 2° stralcio
3. OP/516 Misure di riqualificazione area sud - Bocca di Lido S. Nicolò - 1° Stralcio
4. OP/513-1 Ripristino morfologico area canali Cenesa, Boer e Siletto
5. OP/506-2 Monitoraggio area canale Bastia 1° stralcio

Attività da avviare

1. OP/530 Collettore sottomarino per la raccolta degli sfiori meccanici esistenti ed il loro convogliamento alla rete recapitante verso il fiume Brenta

Attività da finanziare:

1. Prosecuzione degli interventi secondo le previsioni del "Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC-ZPS IT 3250003 e IT 3250023; dei SIC IT 3250030 e IT 32050031 e della ZPS IT 3250046 – quadro aggiornato"

Interventi di morfologia connessa al "Sistema MOSE"**Attività finanziate:****Attività ultimate prima del 2011**

1. OP/460 Vivificazione della superficie delle barene naturali nell'area dei canali Gaggian e S. Felice
2. OP/461 Naturalizzazione e protezione barene 3^a fase 2° lotto
3. OP/455 Naturalizzazione e protezione barene 3^a fase 1° lotto

Attività ultimate nel 2011

1. OP/474 Ripristino Fondali Canaletta Lido

Attività in corso nel 2011

2. OP/428 Ripristino morfologico e ambientale nell'area dei canali dei Marani
3. OP/429 Monitoraggio del ripristino morfologico nell'area dei canali dei Marani
4. OP/454 Ripristino morfologico area lago Teneri - 3° stralcio
5. OP/470 Aree umide Comune di Codevigo e Valle Morosina
6. OP/509-1 Canale Petroli – Barene laterali 2° lotto
7. OP/480 Naturalizzazione e protezione barene 4^a fase

Attività avviate nel 2011

1. OP/509-2 Monitoraggio Canale Petroli – Barene laterali 2° lotto
2. OP/528 Interventi di ripristino morfologico per il completamento delle barene Valle Zappa (Zappa A e B) 1° stralcio
3. OP/526 Interventi di ripristino morfologico ed ambientale nell'area di Val Verde – Coa Storta in laguna nord

Attività da avviare

1. OP/529 Interventi di ripristino dei fondali della canaletta di accesso al porto di Lido

Attività da finanziare:


1. Prosecuzione della ricostruzione di velme, barene e basso fondali mediante utilizzo dei sedimenti provenienti dai lavori in corso alle bocche di porto.

Bocca di Lido

CONFIGURAZIONE OPERE ALLA BOCCA DI PORTO DI LIDO



PLANIMETRIA GENERALE BOCCA DI LIDO

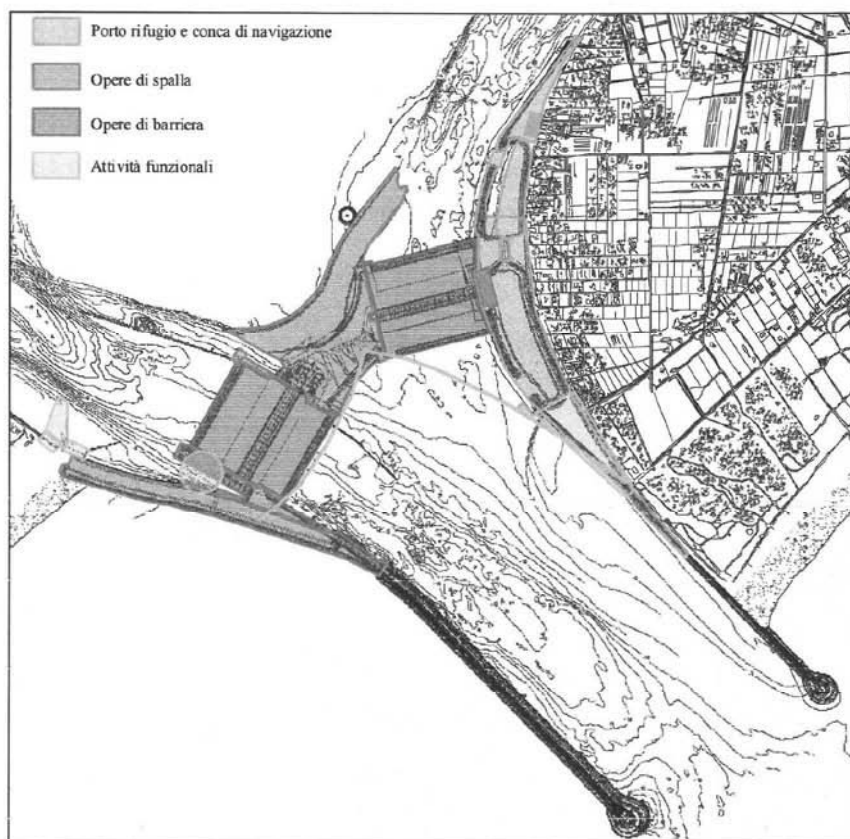





Bocca di Lido - Treporti: veduta di insieme delle lavorazioni a Treporti. In primo piano, il bacino lato laguna




Bocca di Lido - Treporti: in primo piano, il bacino lato mare messo all'asciutto e utilizzato come tura per la prefabbricazione dei cassoni, tutti completati ad eccezione dei due cassoni di spalla, i quali sono comunque in avanzata fase di esecuzione

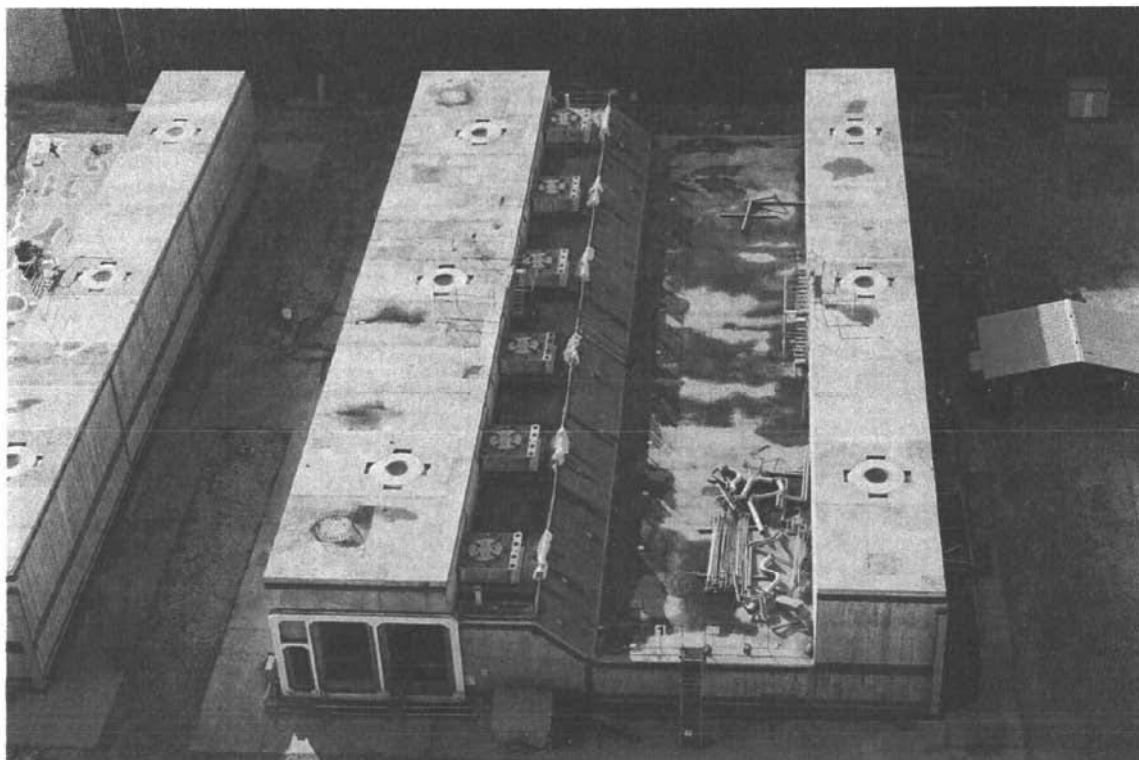

Bocca di Lido - Treporti: in primo piano, un cassone di soglia già del tutto ultimato, con le "femmine" delle cerniere già montate

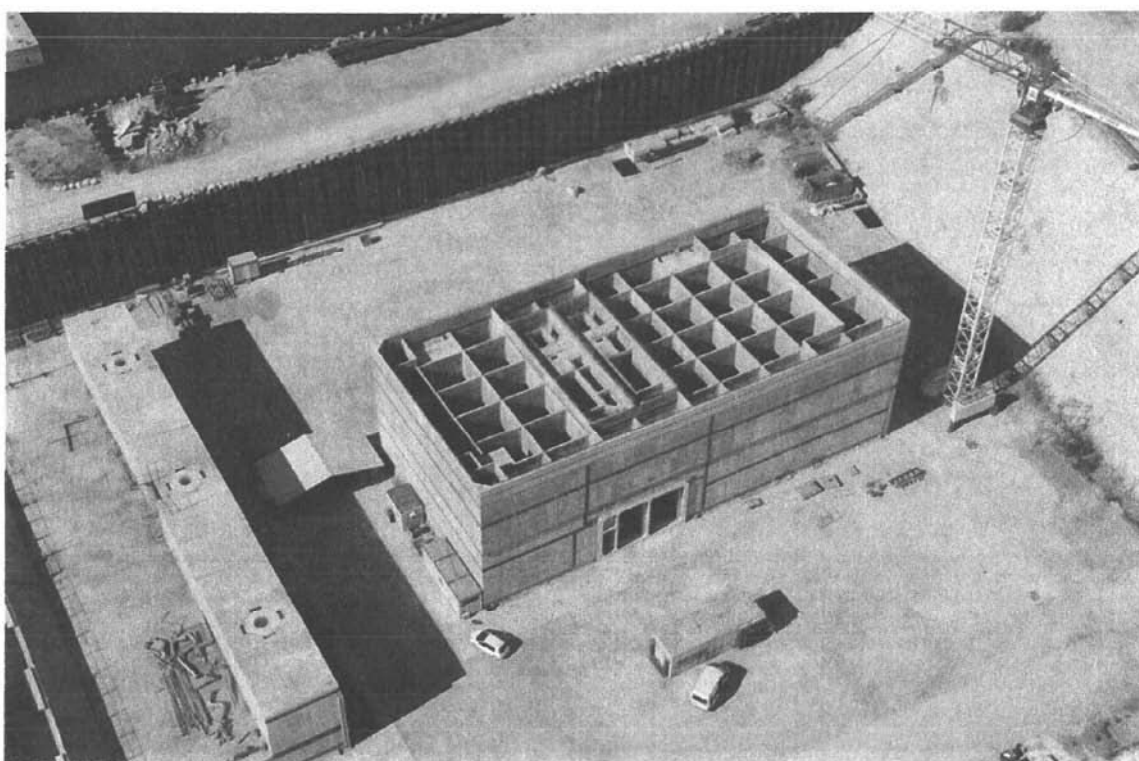

Bocca di Lido - Treporti particolare delle attività di realizzazione del cassone di spalla ovest della barriera di Treporti. In evidenza la struttura cellulare del cassone

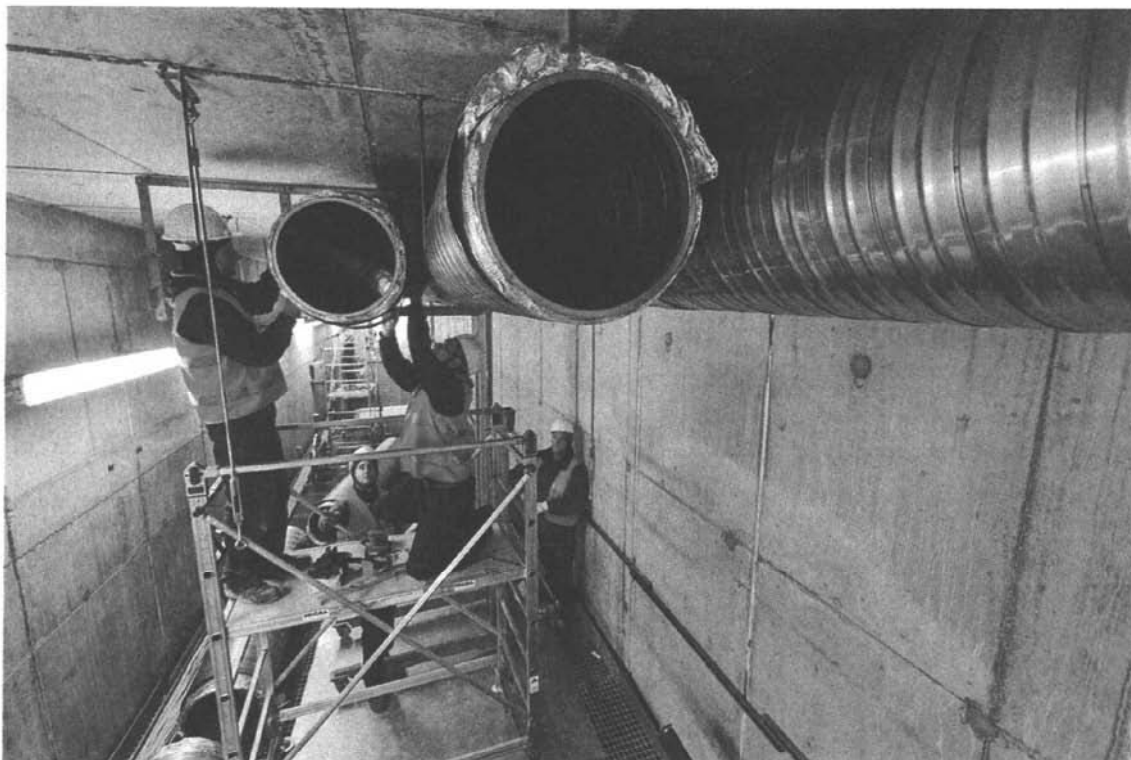

Bocca di Lido- Treporti: lavorazioni per la realizzazione degli impianti per il funzionamento delle paratoie all'interno di una galleria di servizio di un cassone di soglia



Bocca di Lido - Treporti: lavorazioni per l'installazione in un cassone di soglia di un connettore e del rispettivo elemento femmina, in cui verrà incernierata la paratoia




Bocca di Lido: veduta d'insieme della nuova isola della bocca di porto del Lido. In alto la bocca di Treporti con le strutture di spalla




Bocca di Lido - S. Nicolò: strutture di spalla nord di S. Nicolò sull'isola artificiale. In evidenza, gli edifici tecnici che ospiteranno gli impianti per il funzionamento delle barriere

Bocca di Malamocco

CONFIGURAZIONE OPERE ALLA BOCCA DI PORTO DI MALAMOCCHO

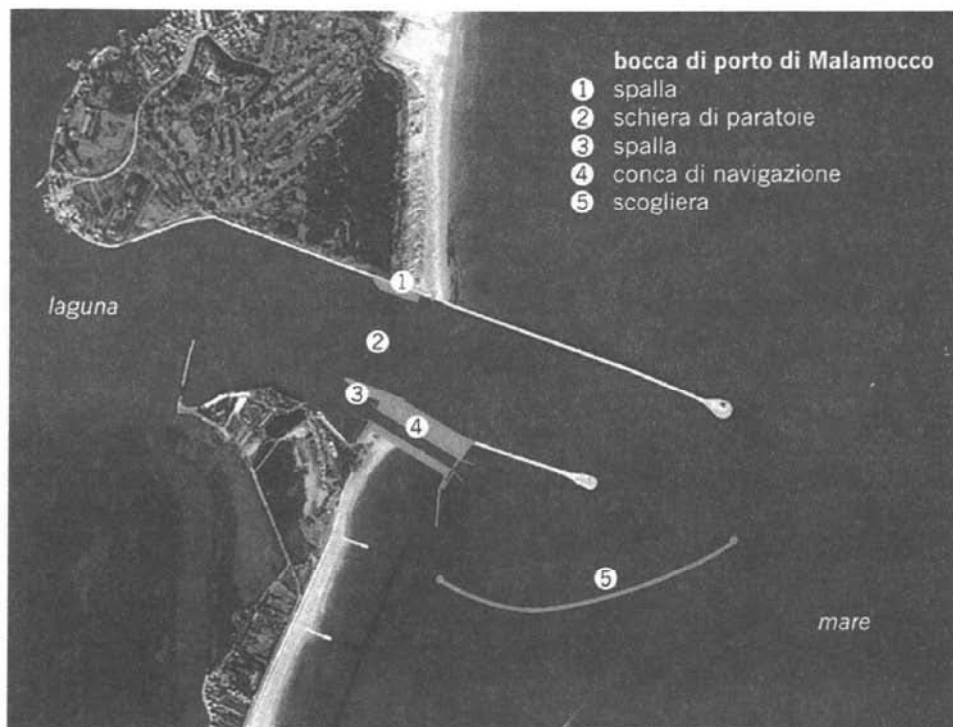

PLANIMETRIA GENERALE BOCCA DI MALAMOCCHO

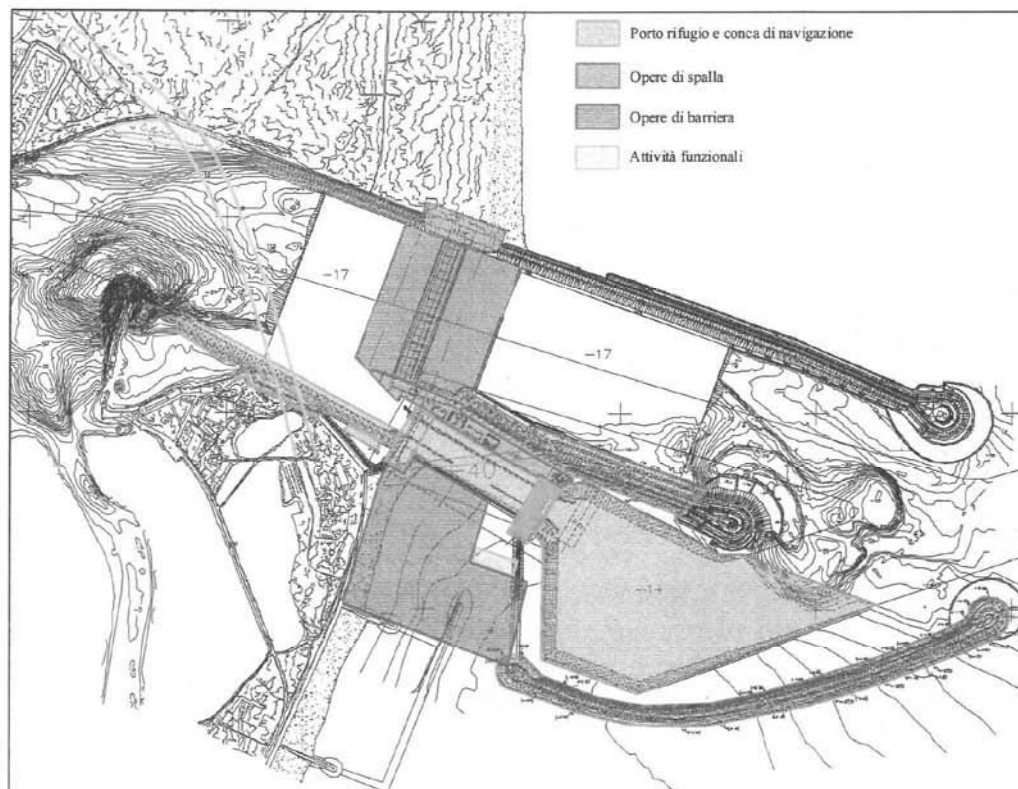



Bocca di Malamocco: veduta d'insieme della conca di navigazione per grandi navi a Malamocco



Bocca di Malamocco: particolare della vasca ove verranno ubicati gli impianti e gli edifici tecnologici



Bocca di Malamocco: veduta d'insieme del rilevato provvisorio sul quale sono eseguite le lavorazioni di prefabbricazione dei cassoni di soglia e di spalla per le barriere di Malamocco e di San Nicolò. In primo piano, il sistema Syncrolift per il varo dei cassoni



Bocca di Malamocco: veduta d'insieme del rilevato provvisorio sul quale sono eseguite le lavorazioni di prefabbricazione dei cassoni di soglia per le barriere di Malamocco e di San Nicolò



Bocca di Malamocco: particolare delle lavorazioni di prefabbricazione dei cassoni, ormai in fase avanzata di realizzazione




Bocca di Malamocco: particolare delle lavorazioni di prefabbricazione dei cassoni




Bocca di Malamocco: veduta d'insieme delle lavorazioni per la realizzazione della spalla nord (lato Alberoni)

Bocca di Chioggia

CONFIGURAZIONE OPERE ALLA BOCCA DI PORTO DI CHIOGGIA

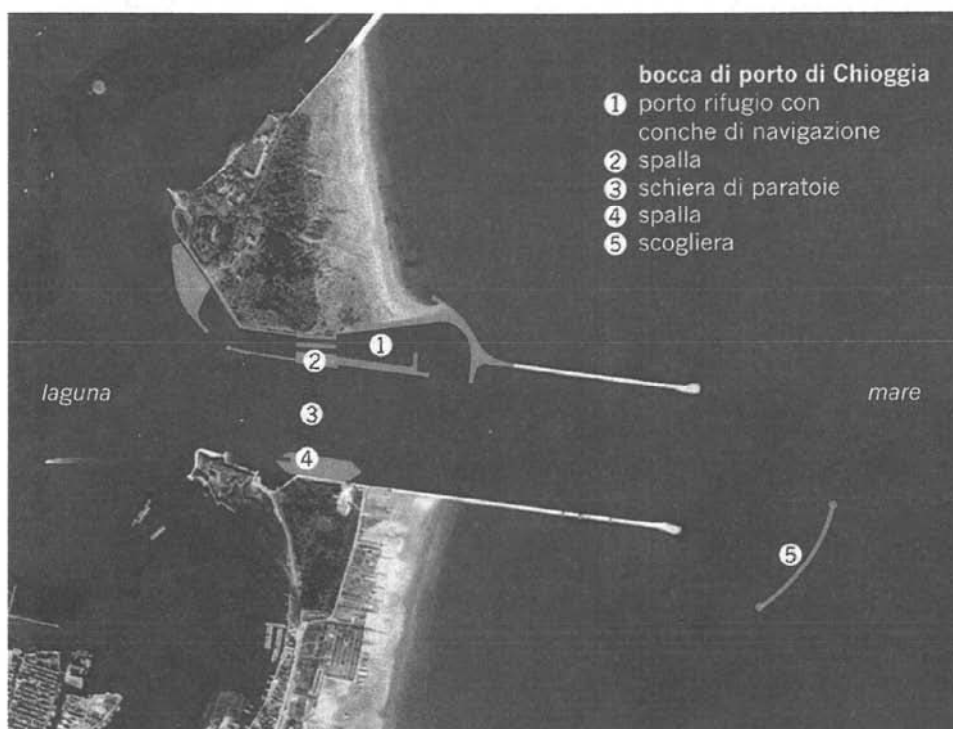

PLANIMETRIA GENERALE BOCCA DI CHIOGGIA

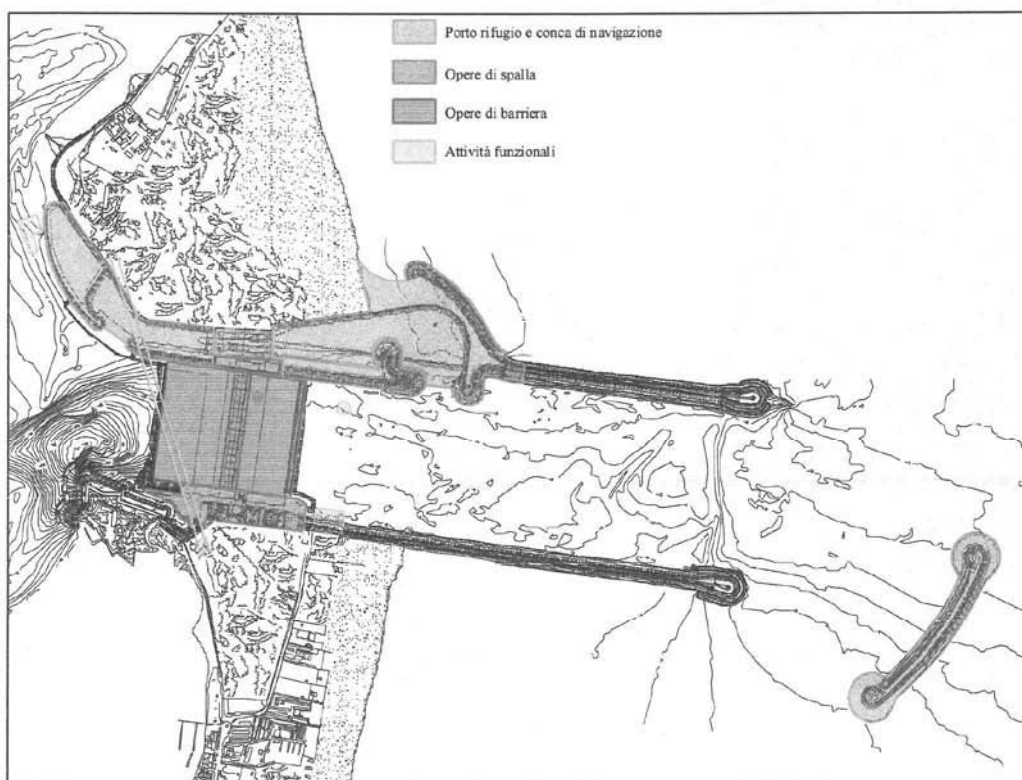




Bocca di Chioggia: In primo piano le conche di navigazione per pescherecci. In alto il bacino lato mare messo all'asciutto e utilizzato come tura per la costruzione dei cassoni di soglia e di spalla



Bocca di Chioggia: Il bacino del porto rifugio lato mare. Il bacino è stato messo all'asciutto e utilizzato come "tura" per la prefabbricazione dei cassoni di alloggiamento delle paratoie della barriera di Chioggia

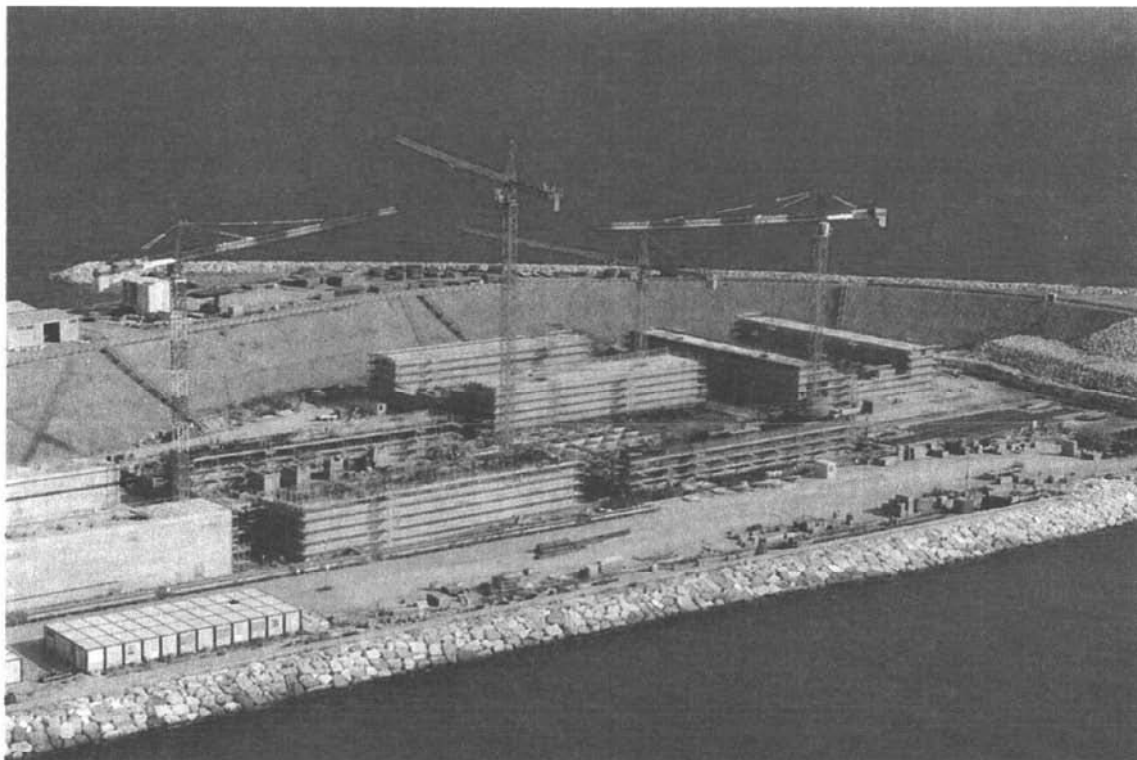

Bocca di Chioggia: il bacino del porto rifugio lato mare. Il bacino è stato messo all'asciutto e utilizzato come "tura" per la prefabbricazione dei cassoni di alloggiamento delle paratoie della barriera di Chioggia



Bocca di Chioggia: la costruzione dei cassoni di soglia della barriera di Chioggia in avanzata fase di realizzazione
